

Reg. Bez. Oberfranken  
Lkr. Bamberg  
Gde. Memmelsdorf  
Gmkg. Memmelsdorf

Reg. Bez. Oberfranken  
Lkr. Bamberg  
Gde. Bamberg  
Gmkg. Hauptsmoor

### 1 V Vermeidungsmaßnahmen beim Bauablauf

**1.1 V Umweltschonendes Baukonzept / Umweltfachliche Baubegleitung (UBB)**  
Die gesamte Baukonzeption wird unter besonderer Beachtung ökologischer Aspekte entwickelt. Aufgrund der zum Teil hochwertigen Biotoptypen im überplanten Bereich ist während der Baumaßnahme der Einsatz einer qualifizierten umweltfachlichen Baubegleitung erforderlich. Die Anlage von erforderlichen Baustraßen spart ökologisch wertgebende Bereiche, wo immer technisch möglich, aus.

Umweltfachliche Baubegleitung für Natur- und Artenschutz  
• Für die Sicherstellung der sachgerechten Umsetzung der in Unterlage 9.3 und ggf. zusätzlich in den Genehmigungsaufgaben genannten Maßnahmen

Umweltfachliche Baubegleitung für Boden- und Gewässerschutz  
• Kontrolle boden- und gewässerschutzrechtlicher Vorgaben

#### 1.2 V Maßnahmen zum Biotopschutz

- Schutzmaßnahmen nach DIN 18920 und RAS-LP 4
- **Vor Beginn** aller Baumaßnahmen werden bauzeitlich **ortsfeste** Bauschutzzäune gemäß Plandarstellung entlang des Baufeldes aufgestellt; nach Abstimmung mit der UBB können auch alternative Sicherungsmaßnahmen erfolgen oder zusätzliche erforderlich werden. Die Standorte befinden sich entlang zu erhaltenden Gehölzbeständen, entlang von nach §30 BNatSchG geschützten Biotopen, Gehölzbeständen sowie Ökotoptflächen
- Ggf. sind auch einzelne Bäume zu schützen und/oder die Ausbildung eines Wurzelvorhangs ist erforderlich
- Nach Abschluss der Arbeiten werden die Schutzeinrichtungen wieder entfernt
- Erforderliche Überschreitungen der vorgegebenen Baufeldgrenzen müssen vorab mit der UBB abgeklärt werden
- Im Baufeld liegende sandige, humusarme Bodenschichten mit Bewuchs von Sandtraggroasen sind inklusive Vegetationsdecke in einer Stärke von 10 - 20 cm abzutragen und getrennt von anderen Bodenschichten zu lagern. Begrünung und Vermischung mit anderen Substraten ist zu vermeiden. Nach Ende der Baumaßnahme ist das Substrat auf den dafür vorgesehenen Sandmagerrasen-Zellflächen in der gleichen Stärke aufzubringen

#### 1.3 V Maßnahmen zum Bodenschutz

- Ordnungsgemäße Trennung von Oberboden und Unterboden beim Bodenabtrag. Zwischenlagerung in Mieten mit max. 2 m Höhe und Zwischenbegrünung
- Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Verdichtung, Erosion, Vermischung und Kontamination
  - Vermeidung von Verdichtung durch lastverteilende Platten und Geotextil für nach §30 BNatSchG geschützte Biotope
  - Zufahrten zu Baustelle und Baustelleneinrichtungsfächen nur auf den vorhandenen und neu befestigten Flächen sowie im Baufeld.
  - Ein besonderes Augenmerk ist auch darauf zu legen, unbelasteten Boden vor jeglicher Verunreinigung zu schützen.
  - Sinnvolle Wiederverwendung vor Entsorgung des anfallenden Bodenmaterials
- Fachgerechte Rekultivierung aller beanspruchten Flächen nach Abschluss der Baumaßnahme
- Entsiegelung nicht mehr benötigter befestigter Flächen

#### 1.4 V Maßnahmen zum Schutz von Gewässern und Feuchtbiensräumen

- Abbruch der Brücke mit Vermeidung des Eintrags von Abbruchteilen, Stäuben oder anderen Stoffe in das Gewässer
  - Beachtung der Schutzvorschriften für Überschwemmungsgebiete (§48 WHG) während der Baumaßnahme
  - Schutz vor Stoff- und Sedimenteintrag in den Boden und in die Gewässer durch geeignete Wasserhaltung während der Bauphase durch geeignete technische Maßnahmen
  - Geordnete Lagerung und schonender Umgang mit umweltgefährdenden Bau- und Betriebsstoffen außerhalb des Überschwemmungsbereichs

### LEGENDE

- Gemeindegrenze
- Geplantes Bauvorhaben  
Straße mit Bankett und Böschungen
- Baufeld / Eingriffsbereich
- Mulde
- Steilwall
- Lärmschutzwand
- Gewässer
- Entsiegelung

#### Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Flächen

- Biotop laut amtlicher Biotopkartierung Bayern (TK 6031)
- geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG
- FFH-Gebiet "Regnitz, Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis Hallstadt"
- Naturschutzgebiet "Börstig bei Hallstadt"
- Landschaftsschutzgebiet "Hauptsmoorwald"
- Ökoflächenkataster
- Bodendenkmal

#### Vermeidungsmaßnahmen

- Biotopschutzzäune (1.2 V)
- Reptilienschutzzaun - temporär (2.4 V)
- Vergrämung in angrenzende Fläche (Haselmaus 2.3 V)
- Absammeln (Haselmaus 2.3 V)
- Zielgebote Vergrämung (Haselmaus 3.2 A<sub>13</sub>)
- Absammeln und in Ersatzhabitate Zaunedeckchen (2.4 V)
- Vergrämen, Absammeln Baufeld freihalten (Zaunedeckchen 2.4 V)
- Absammeln (Windschnecke 2.8 V)
- Wiederherstellung Gebiet für Ameisenbläuling (3.4 A<sub>13</sub>)
- Kontrolle von Brückenbauwerken auf Fledermausbesatz (2.2 V)
- Kontrolle von Durchlässen auf Fischotterspuren (2.6 V)
- Kontrolle auf potentielle Brutstätten (2.8 V)
- Kontrolle auf potentielle Eibervorkommen (2.10 V)
- Pflanzung von Heckengehölzen (5.1 G)
- Ansaat von Böschung und Nebenflächen (5.2 G)
- Entwicklung von Augebüsch/ Auwald (5.3 G)
- Wiederherstellung von Sandmagerrasen (5.5 G)
- Wiederherstellung Extensiv- und Intensivgrünland (5.6 G)

#### Maßnahmenkennung

- Index  
Maßnahmen  
Nr. Einzelmaßnahme  
Nr. Komplex

#### Erläuterung Maßnahmentyp

- V Vermeidungsmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- G Gestaltungsmaßnahme

#### Maßnahmennummer und Beschreibung

#### Vermeidungsmaßnahmen (V)


- 1.1 V Umweltschonendes Baukonzept / Umweltfachliche Baubegleitung (UBB)
- 1.2 V Maßnahmen zum Biotopschutz
- 1.3 V Maßnahmen zum Schutz von Boden
- 1.4 V Maßnahmen zum Schutz von Gewässern und Feuchtbiensräumen
- 2.1 V Zeitliche Vorgaben zur Baufeldräumung
- 2.2 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse
- 2.3 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für die Haselmaus
- 2.4 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für die Zaunedeckchen
- 2.5 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für die Bachmuschel
- 2.6 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für den Fischotter
- 2.7 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für Brutvögel
- 2.8 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für die Schmale Windschnecke
- 2.9 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für die Blaufüßige Ödlandschrecke, die Blaufüßige Sandschrecke und die Kretselwespe
- 2.10 V Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für die Blaufüßige Ödlandschrecke, die Blaufüßige Sandschrecke und die Kretselwespe

#### Ausgleichsmaßnahmen (A)

- 3.1 A<sub>13</sub> Maßnahmen für Fledermäuse
- 3.2 A<sub>13</sub> Maßnahmen für die Haselmaus
- 3.3 A<sub>13</sub> Maßnahmen für die Zaunedeckchen
- 3.4 A<sub>13</sub> Maßnahmen für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling
- 3.5.3 A<sub>13</sub> Aufhängen von 20 Nistkästen für Vögel

#### Gestaltungsmaßnahmen (G)

- 5.1 G Anlage von Hecken/ flächigen Gehölzbeständen
- 5.2 G Ansaat von Böschungs- und Nebenflächen
- 5.3 G Entwicklung von Augebüsch/ Auwald
- 5.4 G Wiederherstellung von offenen Feuchtrückstrukturen
- 5.5 G Wiederherstellung Sandmagerrasen
- 5.6 G Wiederherstellung Extensiv- und Intensivgrünland

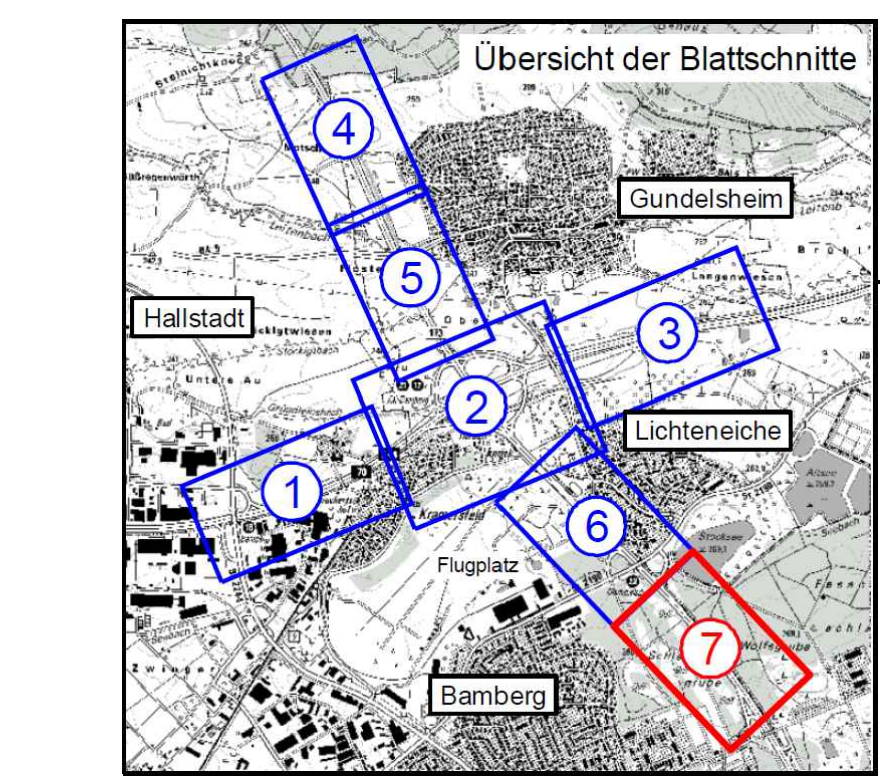

Übersicht Blattsnitte

Blatt 1 2 3 4 5 6 7

Entwurfsbearbeitung:	OPUS GmbH Richard-Wagner-Straße 35 95444 Bayreuth Tel: 0921 - 50 72 07 0 opus@bth.de	bearbeitet: 05.12.2023 gezeichnet: 05.12.2023 geprüft: 05.12.2023 Projekt-Nr.: 3418 Bayreuth, 05.12.2023	H. Grimm H. Strobel J. Müller
----------------------	--	--	-------------------------------------

Die Autobahn Niederlassung Nordbayern Außenstelle Bayreuth Wittelsbacherstr. 15, 95444 Bayreuth	bearbeitet: gezeichnet: geprüft: PSP-Nr.: Bezeichnung: Datum:	Fr. Köpper Hr. Harber A.02023-00 AK Bamberg 05.07.2023 baw_98700_ss_0620
--	--	---

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

Lagesystem	Gauß-Krüger, DHDN90	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN12 (NN)	Bestandsvermessung	2005-2017

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.2 / 7 Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan
Straße / Abschnitt-Nr. / Station: A70_400_0_055 - A70_420_1_303 A73_390_2_052 - A73_450_0_849	Maßstab: 1 : 1.000
PROJIS-Nr.: A70 Schweinfurt - Bayreuth und A73 Lichtenfels - Nürnberg	

Nachträgliche Lärmvorsorge einschließlich Anpassungen am AK Bamberg A70: von Bau-km 64+240 bis Bau-km 66+964, A73: von Bau-km 95+420 bis Bau-km 99+400	Aufgestellt: xx.xx.2023 Niederlassung Nordbayern Außenstelle Bayreuth GB BA - Planung und Bau	Aufgestellt: xx.xx.2023 Niederlassung Nordbayern Außenstelle Bayreuth GB BA - Planung und Bau
---	--	--

IA, Post, Geschäftsbereichsleiter

**MUSTERMAPPE**  
23.10.2023

© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de  
© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten  
Bezugssystem: Gauß-Krüger  
Transformation UTM<=>GK=>3DIM-SAL  
Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Reg. Bez. Oberfranken  
Stadt Bamberg  
Gde. Bamberg  
Gmkg. Hauptsmoor

